


Webinar

التحول التقني

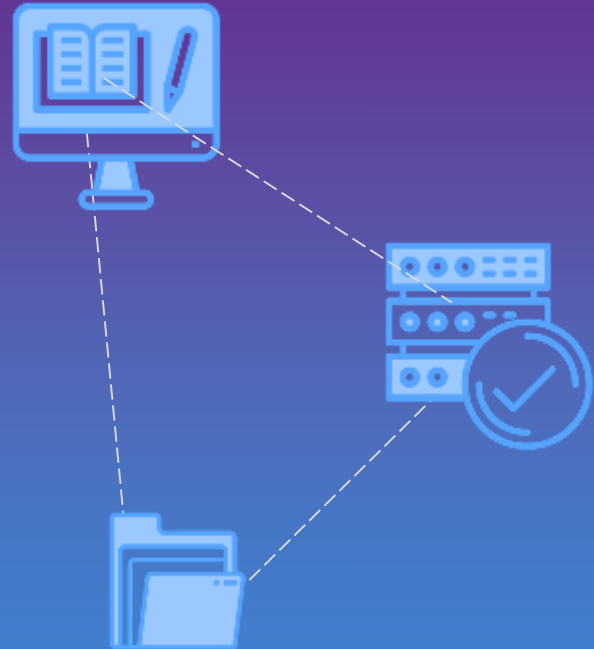

webinars.altqniah.sa

التحول التقني
TechTrans



إدارة المشاريع باستخدام MS-Project



م. بندر بن محمد الحديثي



مقدمة

أهمية الموضوع والفائدة
المرجوة،

من منا لا يعمل مع مشاريع؟ من لا يدير مشاريع؟

جميعنا نتعامل مع مشاريع ونديرها!! نعم تلك التي تلامس حياتك لوحدك
تجد نفسك أنت المسؤول عن نجاحها أو فشلها.
دراستك، بحثك، عملك، بيتك، وغيرها

هل احتاج أن أتمتع بمهارة إدارة المشاريع؟

تستطيع الذهاب من هنا إلى مكة

بمعرفة الطريق: الوصف وأفضل الطرق
بأدوات تمكنك من ذلك: بقديمك، بدراجة، بسيارة، بطائرة،

نعم نحتاج المعرفة وأيضاً كل ما كانت أدواتك جيدة كل ما كان أدائك
أفضل كل ما اختصرت الوقت ورفعت الجودة.



ما هو المشروع؟

إدارة المشاريع؟؟



المشروع

وإدارة المشاريع

ما هو المشروع؟

المشروع: جهد مبدول مؤقت لإنشاء منتج فريد، خدمة أو نتائج.

ما هي إدارة المشروع؟

هي تطبيق المعارف، المهارات، الادوات والتقنيات على أنشطة المشروع للوفاء بمتطلبات المشروع.



ماذا نحتاج؟ للعمل مع المشاريع



تحليل وتقديرات
ودراسات
وتخطيط



إدارة وتواصل



متابعة
ومشاركة



وثائق وتقارير




إدارة موارد



موارد ووقت



لماذا برنامج MS- Project

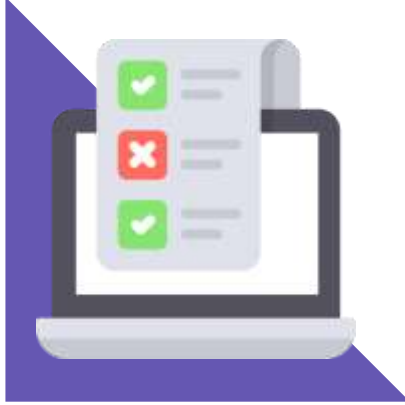

- يعتبر برنامج MS Project من البرامج الرائعة في مجال ادارة المشاريع حيث يستخدم مع أي مشروع سواء كان خدمي او انساني او تجاري و يعتبر من أسهل البرامج و من البرامج القوية في تقديم الخدمات المتنوعة حيث يساعدك في إدارة مشروعك.



ماذا يمكنني منه

تحديد أوقات المهام
وعلاقتها ببعض

02

تحديد المهام

01

حساب التكلفة لكل
مهمة

04

تحديد الموارد لكل
مهمة

03



هل سأستطيع أدير المشاريع بمعرفتي لبرنامج MS-Project فقط؟



الجميل أن من يعرف
الطريق سيحتاج لشخص
مثلك يعرف قيادة السيارة



تستطيع قيادة السيارة لكن
لا تعرف طريق مكة



برنامج


MS-Project

واجهة البرنامج
التعامل مع الواجهة
المهام
التوقيت الزمني
الموارد
التقارير
تحديث الجدول الزمني




واجهة البرنامج؟

- كبرنامج من مجموعة برامج مايكروسوفت نجد أن كثير من أدوات التنسيق والتعامل مع الملف تشابه لبرامج الأوفيس. لذا فسنجد أن الغالبية ستجد متعة في التعامل مع البرنامج بشكل عام.
- النقاط الخاصة بالتحكم في المشاريع هي ما يميز البرنامج ونحتاج إلى التعامل معها ومعرفة فائدتها.

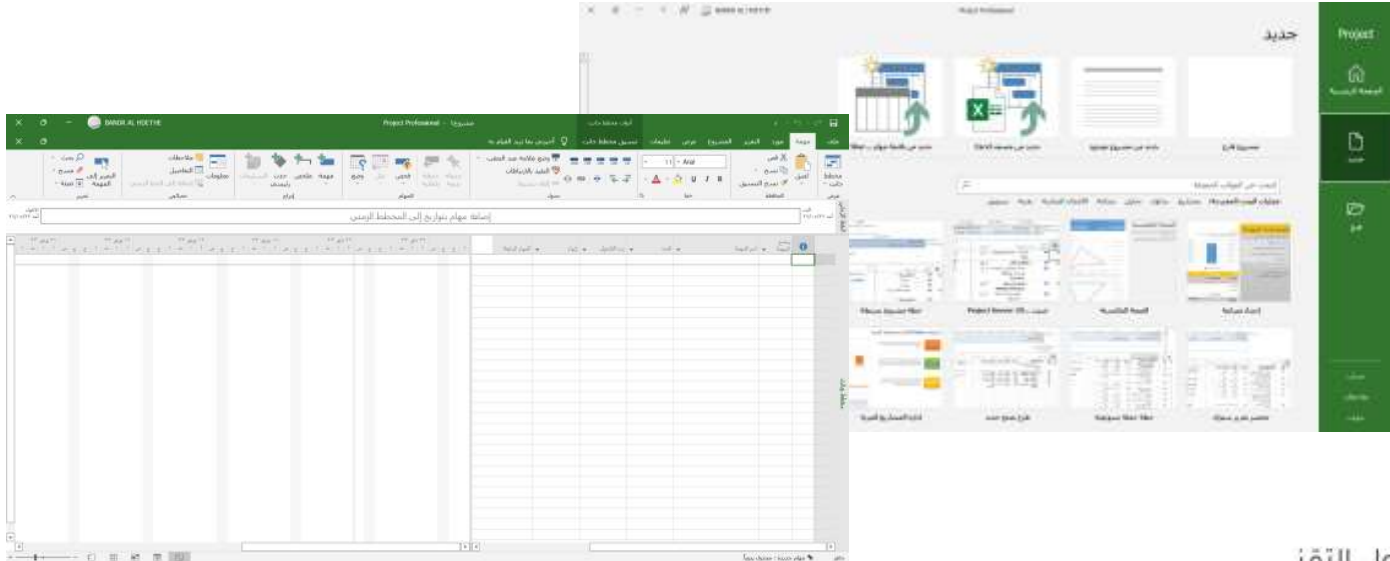

واجهة البرنامج؟

التبويبات الرئيسية

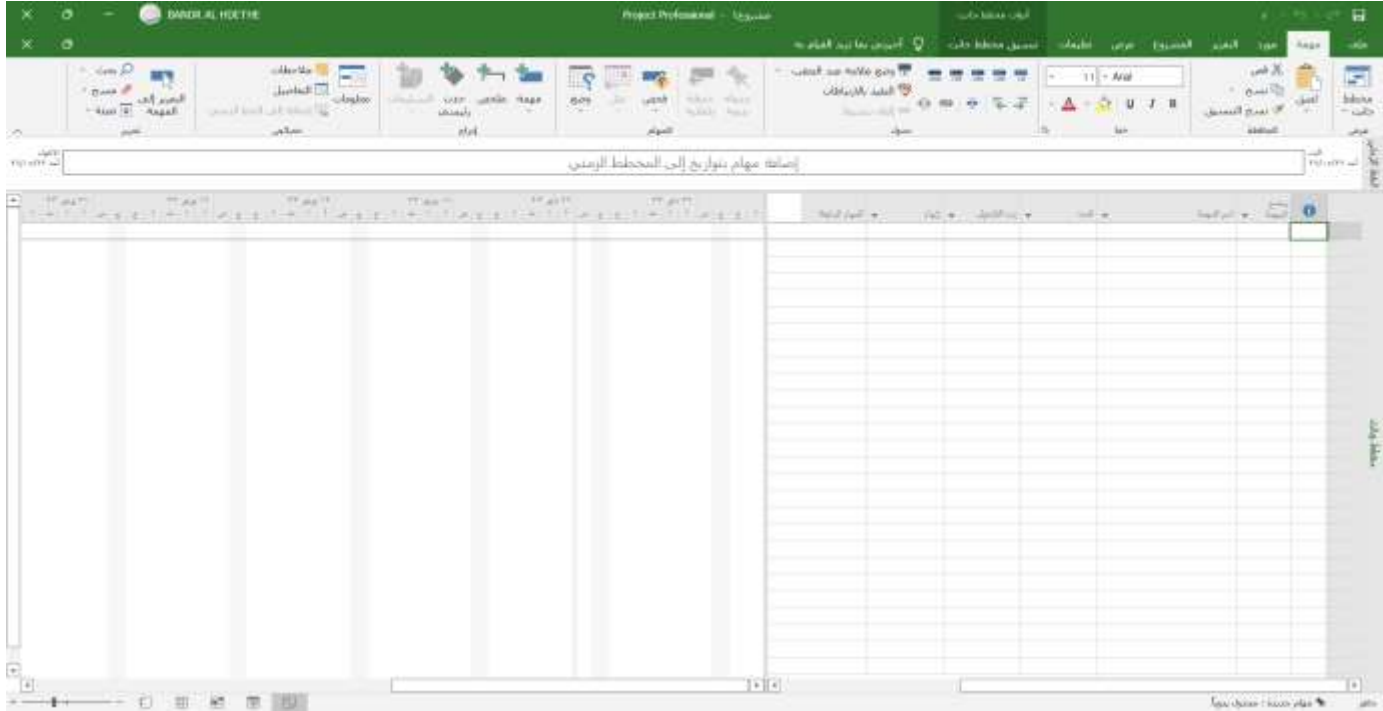

المخطط الزمني

مساحة العمل

أدوات التبوية

مساحة العمل



اسم المهمة	المدة	بدء التشغيل	إنهاء	المهام السابقة
التحضير للمشروع	2.38 يوم	أحد 29/05/22	ثلاثاء 31/05/22	
مراجعة متطلبات المشروع	2 يوم	أحد 29/05/22	اثنين 30/05/22	
اجتماع لاعتماد نطاق المشروع	3 ساعة	اثنين 30/05/22	اثنين 30/05/22	2FF
توقيع العقد	3 ساعة	ثلاثاء 31/05/22	ثلاثاء 31/05/22	3
التخطيط للمشروع	6 يوم	ثلاثاء 31/05/22	ثلاثاء 07/06/22	
تحديد هيكل الاعمال	4 يوم	ثلاثاء 31/05/22	أحد 05/06/22	4
مراجعة الموارد للأعمال	3 يوم	ثلاثاء 31/05/22	سبت 04/06/22	6SS
تحديد مدة الأعمال	2 يوم	ثلاثاء 31/05/22	خميس 02/06/22	6SS
تحديد مخاطر الأعمال	2 يوم	خميس 02/06/22	سبت 04/06/22	8SS
تحديد متطلبات الجودة للأعمال	2 يوم	خميس 02/06/22	سبت 04/06/22	9SS
تحديد تكلفة الأعمال	2 يوم	أحد 05/06/22	اثنين 06/06/22	10
اعتماد خطة المشروع	3 ساعة	ثلاثاء 07/06/22	ثلاثاء 07/06/22	11
تنفيذ المشروع	51 يوم	ثلاثاء 07/06/22	خميس 04/08/22	12
اجتماع بدء التنفيذ	3 ساعة	ثلاثاء 07/06/22	ثلاثاء 07/06/22	11
التصميم	12 يوم	ثلاثاء 07/06/22	اثنين 20/06/22	
تصميم قاعدة البيانات	5 يوم	ثلاثاء 07/06/22	اثنين 13/06/22	14
تصميم كائنات النظام	3 يوم	ثلاثاء 07/06/22	سبت 11/06/22	16SS
تصميم UI/UX	7 يوم	ثلاثاء 07/06/22	ثلاثاء 14/06/22	14SS
مراجعة التصميم	3 يوم	أربعاء 15/06/22	سبت 18/06/22	18
اعتماد تصميم UI/UX	2 يوم	أحد 19/06/22	اثنين 20/06/22	19
البرمجة	30 يوم	ثلاثاء 21/06/22	اثنين 25/07/22	
بناء قاعدة البيانات	5 يوم	ثلاثاء 21/06/22	أحد 26/06/22	20
برمجة الواجهات	12 يوم	ثلاثاء 21/06/22	اثنين 04/07/22	20
ربط الواجهات بقواعد البيانات	10 يوم	ثلاثاء 05/07/22	سبت 16/07/22	23
برمجة api	8 يوم	أحد 17/07/22	اثنين 25/07/22	24
الاختبارات	9 يوم	ثلاثاء 26/07/22	خميس 04/08/22	
اختبار قواعد البيانات	3 يوم	ثلاثاء 26/07/22	خميس 28/07/22	25
اختبار التحقق في الـ API	5 يوم	ثلاثاء 26/07/22	أحد 31/07/22	25
اختبار api	4 يوم	اثنين 01/08/22	خميس 04/08/22	28
اغلق المشروع	13 يوم	سبت 06/08/22	سبت 20/08/22	
تسليم المنصة للعميل	1 يوم	سبت 06/08/22	سبت 06/08/22	29
مراجعة العميل	10 يوم	أحد 07/08/22	أربعاء 17/08/22	31
اغلق مع العميل	2 يوم	خميس 18/08/22	سبت 20/08/22	32

الشرع في العمل إنشاء مشروع جديد

- قم بفتح البرنامج
- أدخل المهام الموضحة
- أدخل تفاصيل المدد الزمنية
- أدخل تفاصيل الموارد

الشرع في العمل إنشاء مشروع جديد

- الخط الزمني للمشروع

اليوم	
أحد 29/05/22	البدء
أ 22 يونيو '22	التخطيط 3 ثلثاء
أ 22 يوليو '22	البرمجة ثلثاء 21/06/22 - اثنين 25/07/22
أ 22 أغسطس '22	الاختبارات ثلثاء 26/0
أ 20/08/22	انغلاق المشروع سبت 06/08/22 - سبت
	التنفيذ المشروع ثلثاء 07/06/22 - خميس 04/08/22
	التصميم ثلثاء 07/06/22 -

شكراً لكم
Thank you

م. بندر بن محمد الحديثي



التعلم المستمر — عادة الناجحين



سلسلة من الندوات المباشرة عبر الإنترنت، يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين، بهدف المساهمة في رفع الوعي التقني لدى كافة أفراد المجتمع.



لمشاهدة محاضرات
ويبينار التحول التقني



TTS.SA

@altqniah



0566065533



011-2000290



Webinars@tts.sa

التحول التقني
TechTrans

